





Nova Magnolia (I черга)

Звіт про виконання робіт

31.01.2023

Зони ведення будівельних робіт (I черга)

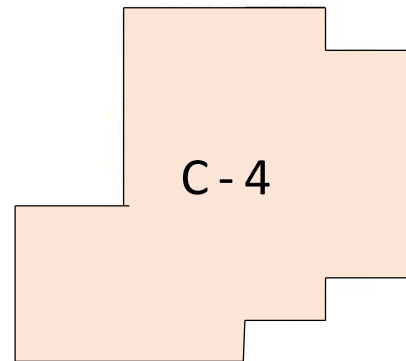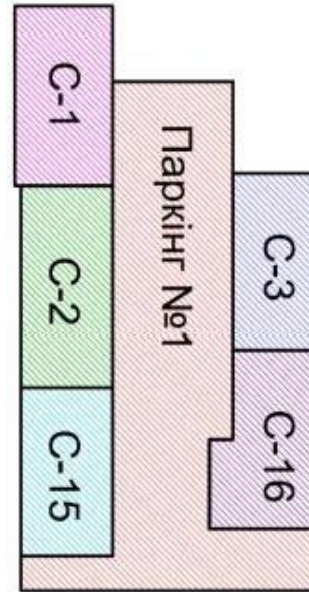

Секція–1	798,85м ²
Секція–2	1 765,86м ²
Секція–3	1 678,61 м ²
Секція–15	1 680,86м ²
Секція–16	2 222,97м ²
Секція–4	6 190,00м ²
С разом	14 337,15м²

Зона будівництва I черги (секції 1, 2, 3, 15, 16 та 4)



Зона будівництва секцій 1, 2, 3, 15, 16



Виконані роботи:

Завершено влаштування конструктиву ростверків секцій 1,2,3,16 – 100%
Виконано конструктив ростверків секції 15 – 70%

Наступний етап:

Влаштування бетонної підготовки в межах ростверків усіх секцій

Влаштування монолітних стін та конструкцій підвальних приміщень (вертикальні конструкції)

Гідроізоляція вертикальних залізобетонних конструкцій



Виконані роботи:

Запроектований та влаштований фундамент під кран баштовий – *100%*

Встановлено кран баштовий та проведено пусконаладжувальні роботи – *100%*

На сьогодні на об'єкті працюють два крани: баштовий та гусеничний типу РДК



Зона будівництва секції 4



Виконані роботи:

Виконуються роботи з влаштування котловану секції 4 – *100%*

Виконуються роботи з влаштування палевого поля – *100%*

Наступний етап:

Влаштування ростверків секції 4

