

Секція-1 - 798,85 м2

Виконані роботи:

- Завершено армування стін та колон другого поверху.
- Виконується бетонування стін та колон другого поверху.

Наступний етап:

- Монтаж опалубки плити перекриття над другим поверхом.
- Продовження робіт з влаштування монолітних конструкцій вище відм. 0.000.







Секція-2 - 1 765,86 м2

Виконані роботи:


- Виконуються роботи армування плити перекриття над першим поверхом.

Наступний етап:

- Бетонування плити перекриття над першим поверхом.
- Продовження робіт з влаштування монолітних конструкцій вище відм. 0.000.





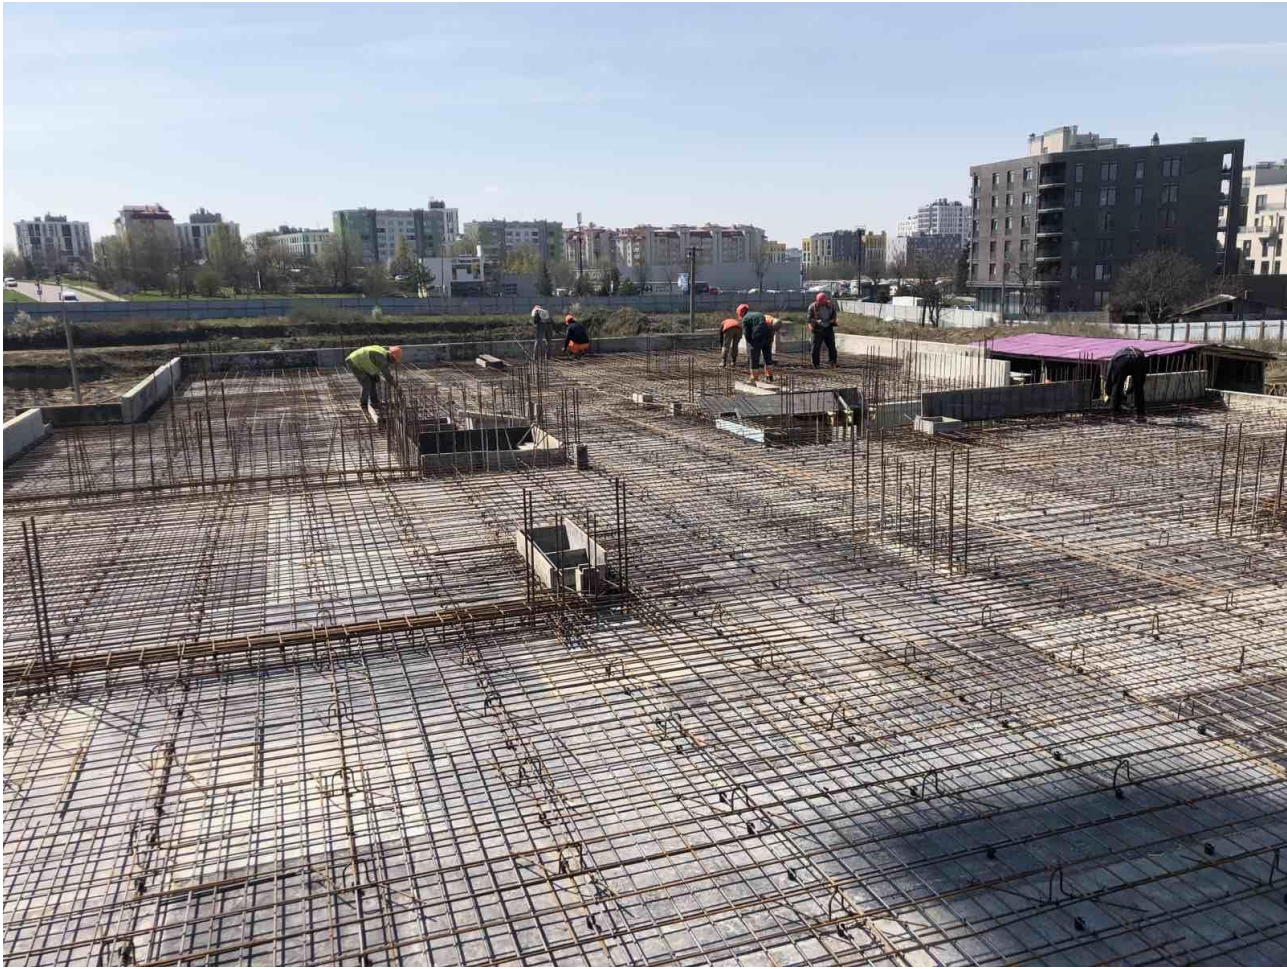

Секція-3 - 1 678,61 м2

Виконані роботи:

- Виконуються роботи з монтажу опалубки плити перекриття над першим поверхом.

Наступний етап:

- Армування та бетонування плити перекриття над першим поверхом.
- Продовження робіт з влаштування монолітних конструкцій вище відм. 0.000.









Секція-15 - 1 680,86 м2

Виконані роботи:

- Завершено влаштування бетонної підготовки підлоги.

Наступний етап:

- Влаштування плити перекриття підвального поверху.
- Продовження робіт з влаштування монолітних конструкцій вище відм. 0.000






Секція-16 - 2 222,97 м2

Виконані роботи:

- Завершено армування стін та колон першого поверху
- Продовжується бетонування стін та колон першого поверху.

Наступний етап:

- Монтаж опалубки плити перекриття над першим поверхом.
- Продовження робіт з влаштування монолітних конструкцій вище відм. 0.000.

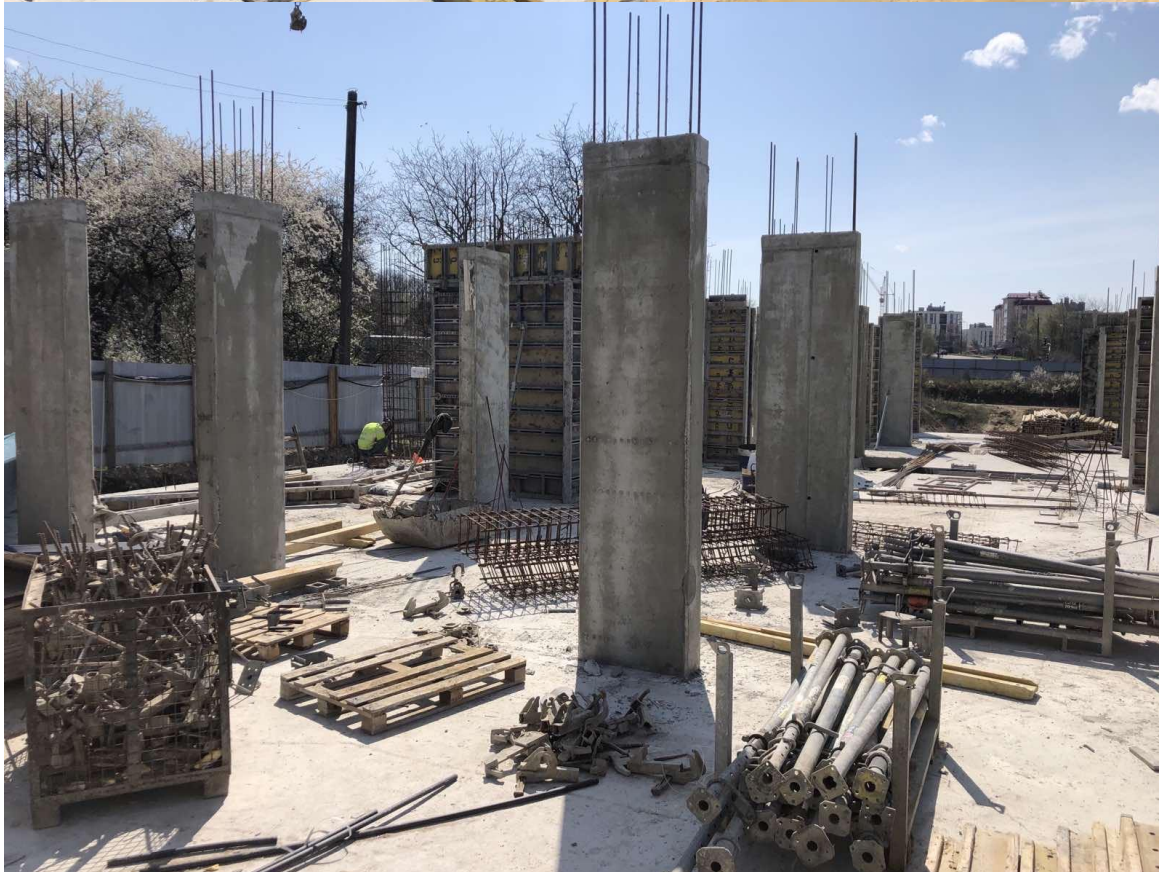







Паркінг-1 - 77 парк.місць

Виконані роботи:

- Виконуються роботи армування та бетонування прижимної стіни паркінгу.
- Виконуються роботи з армування стін та колон паркінгу, частково виконано бетонування.

Наступний етап:

- Продовження бетонування монолітних конструкцій паркінгу.





